


| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | mar '12 | | | | | abr '12 | | | |
|----|------|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----|----|----|----|---------|----|---|--|
| | | | | | | completado | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 0 | |
| 0 | 36% | SEGUIMIENTO PDI | 210 días | lun 05-03-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 1 | 100% | PLANIFICACIÓN | 5 días | lun 05-03-12 | vie 09-03-12 | | | | | | | | | |
| 2 | 100% | DETERMINAR UNA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PDI | 5 días | lun 05-03-12 | vie 09-03-12 | | | | | | | | | |
| 3 | 100% | Reunión de trabajo con Dir. Planificación para diseñar método de seguimiento. | 5 días | lun 05-03-12 | vie 09-03-12 | | | | | | | | | |
| 4 | 100% | Determinación metodología. | 5 días | lun 05-03-12 | vie 09-03-12 | | | | | | | | | |
| 5 | 100% | IMPLEMENTACIÓN | 89 días | lun 12-03-12 | jue 12-07-12 | | | | | | | | | |
| 6 | 100% | DIFUSIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PDI | 15 días | lun 12-03-12 | vie 30-03-12 | | | | | | | | | |
| 7 | 100% | Entregar instrucciones a unidades interesadas. | 15 días | lun 12-03-12 | vie 30-03-12 | | | | | | | | | |
| 8 | 100% | IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO | 15 días | lun 12-03-12 | vie 30-03-12 | | | | | | | | | |
| 9 | 100% | Aplicación metodología proyecto. | 15 días | lun 12-03-12 | vie 30-03-12 | | | | | | | | | |
| 10 | 100% | CONFECCIÓN DE MATRICES DE RIESGO DE PROYECTOS PDI | 89 días | lun 12-03-12 | jue 12-07-12 | | | | | | | | | |
| 11 | 100% | Reunión de trabajo con Dir. Planificación para identiifcar proyectos prioritizados y bases de su determinación | 15 días | lun 12-03-12 | vie 30-03-12 | | | | | | | | | |
| 12 | 100% | Convocatoria del CAR, para someter aprobación de proyectos prioritizados por Dir Planificación. | 67 días | lun 26-03-12 | mar 26-06-12 | | | | | | | | | |
| 13 | 100% | Creación en el sistema PAWS de los proyectos PEDI y su priorización. | 65 días | mié 28-03-12 | mar 26-06-12 | | | | | | | | | |
| 14 | 100% | Determinación de Matriz de Riesgos de Proyectos prioritizados a | 79 días | lun 26-03-12 | jue 12-07-12 | | | | | | | | | |
| 15 | 100% | Comunicación de la Matriz de Riesgo de Proyectos del PEDI y d | 79 días | lun 26-03-12 | jue 12-07-12 | | | | | | | | | |
| 16 | 0% | EJECUCIÓN | 115 días | lun 16-07-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 17 | 0% | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | 115 días | lun 16-07-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 18 | 0% | Ejecución de auditoría de seguimiento, levantamiento y validación de hallazgos con auditados | 115 días | lun 16-07-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 19 | 0% | Informe de resultado avance de auditoría al CAR. | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 20 | 0% | Conciliación plan de mejora con auditado y CAR. | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 21 | 0% | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES CORRECTIVAS | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 22 | 0% | Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora. | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 23 | 0% | APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL PEDI | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 24 | 0% | Cierre de seguimiento y cuenta a CAR de resultados | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |
| 25 | 0% | Aprobación de resultados de la ejecución del plan de seguimiento de proyectos del PEDI | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |

| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | mar '12 | | | | | abr '12 | |
|----|----|--|----------|--------------|--------------|---------|----|----|----|----|---------|---|
| | | | | | | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 0 |
| 26 | 0% | Comunicación a la (H) Junta Directiva y C.G.R. | 85 días | lun 27-08-12 | vie 21-12-12 | | | | | | | |




| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |

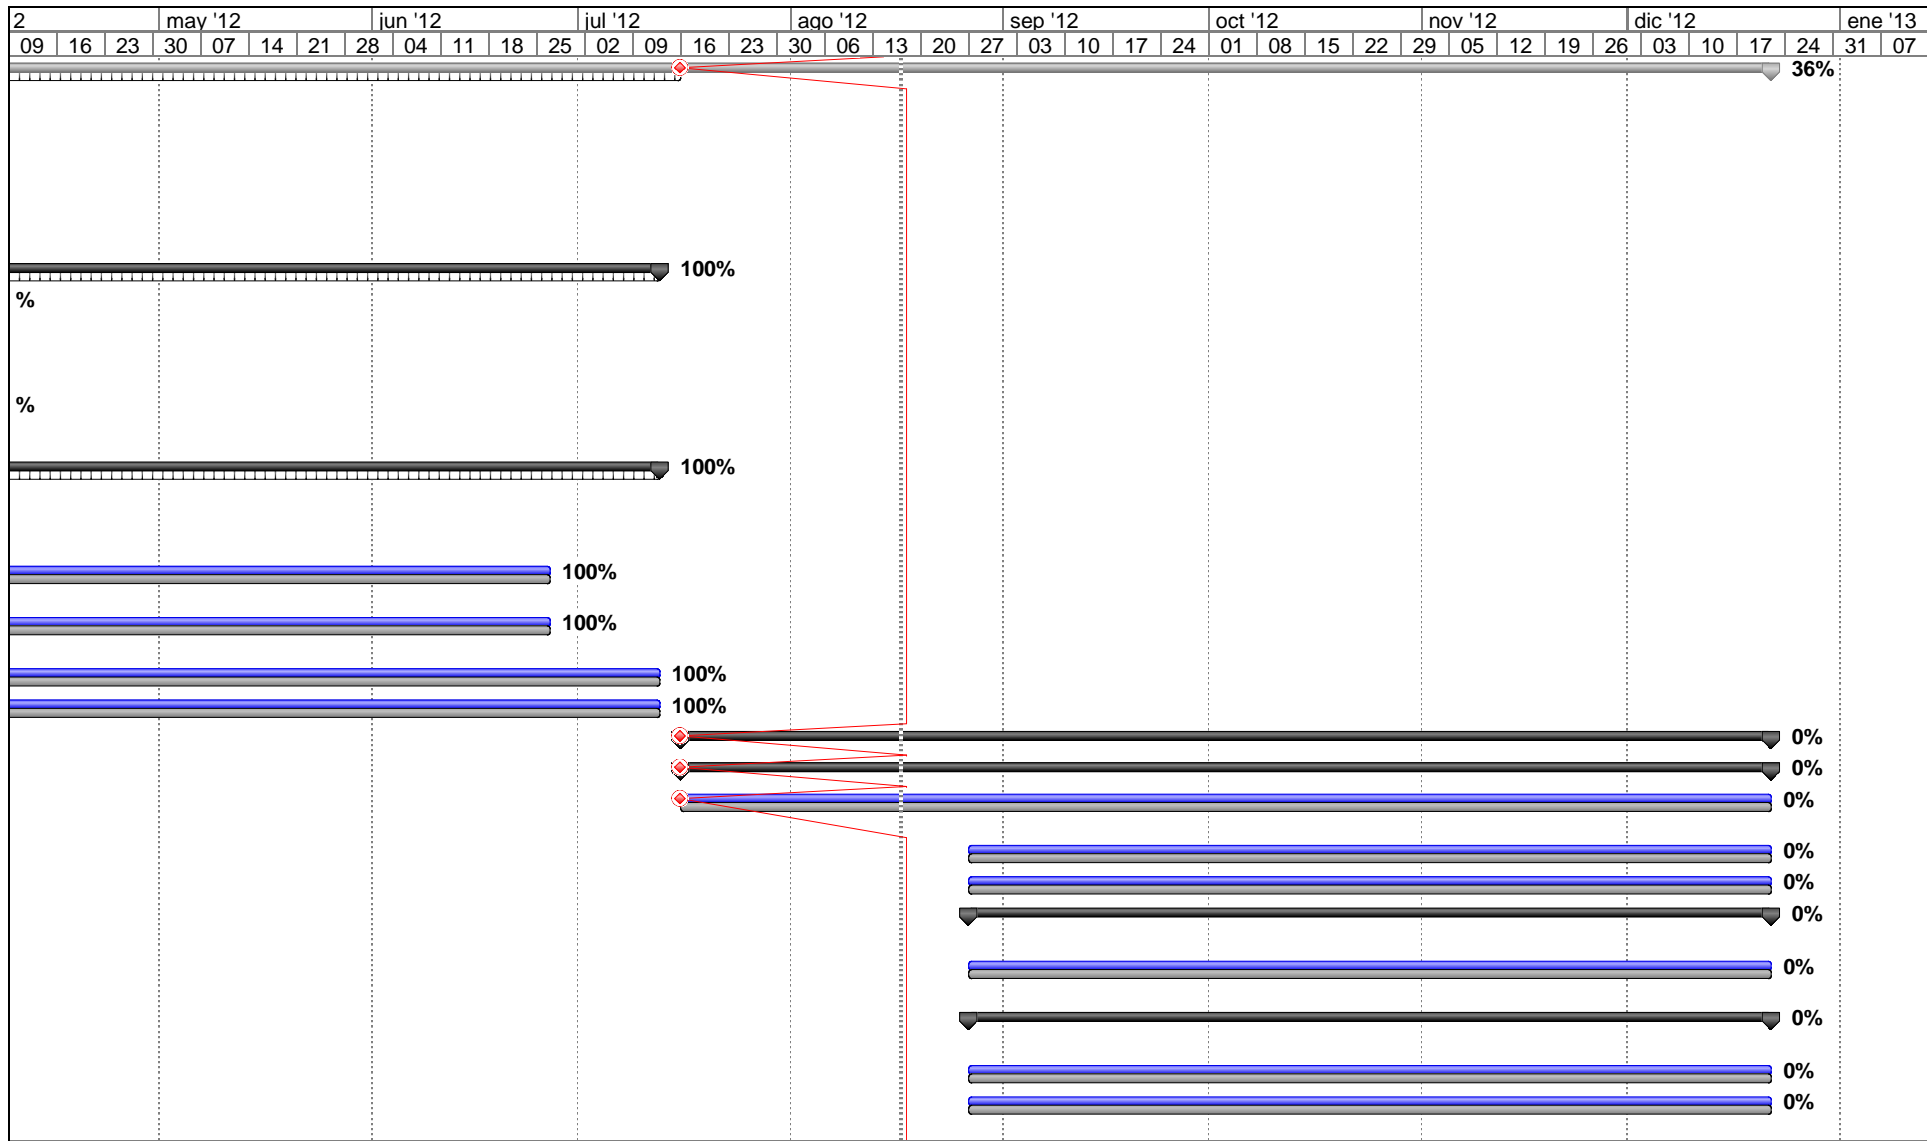


| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|
| 2 | may '12 | | | | jun '12 | | | | jul '12 | | | | ago '12 | | | | sep '12 | | | | oct '12 | | | | nov '12 | | | | dic '12 | | | | ene '13 | | | | | | |
| 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 |




| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |

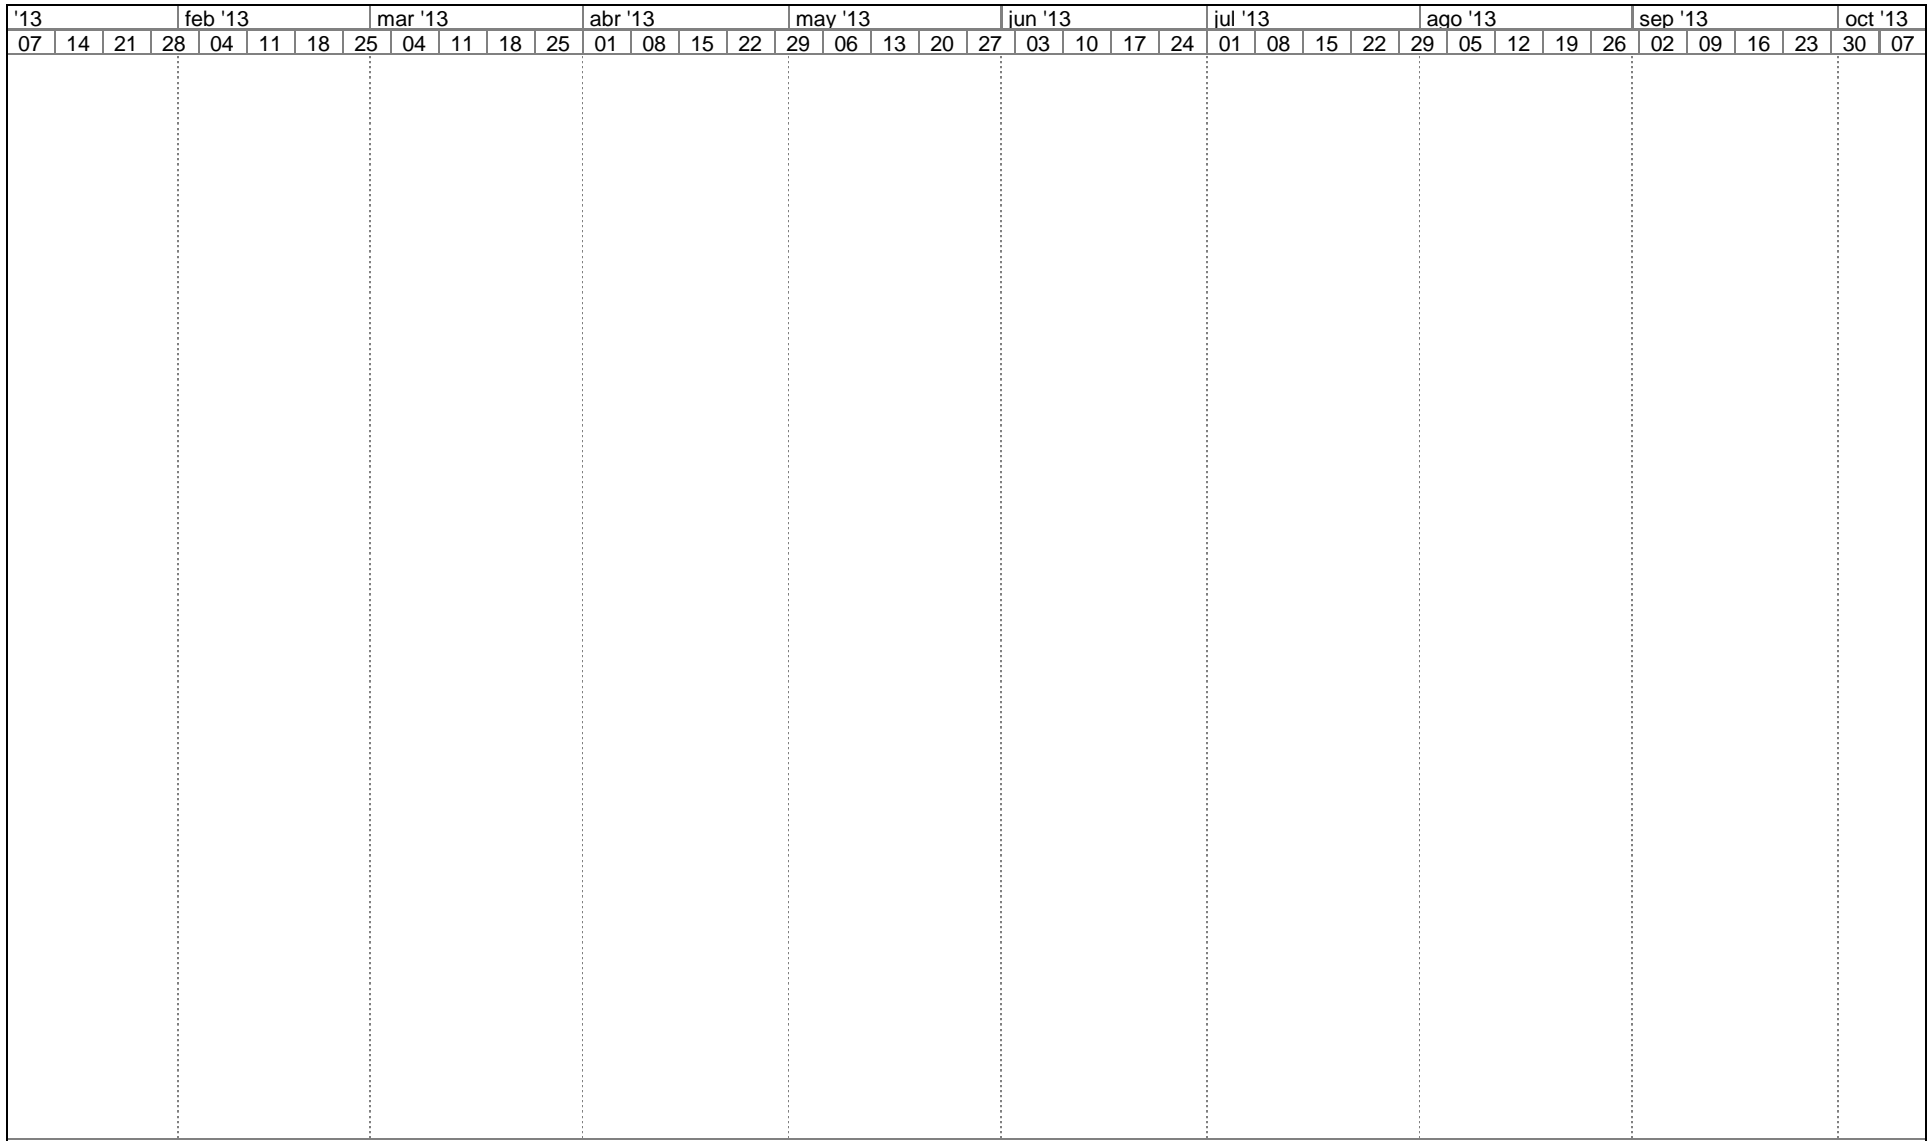

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| '13 | | | | feb '13 | | | | mar '13 | | | | abr '13 | | | | may '13 | | | | jun '13 | | | | jul '13 | | | | ago '13 | | | | sep '13 | | | | oct '13 | | | |
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 |



| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: SEGUIMIENTO PDI Fecha: vie 17-08-12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |
